

INFORME DE FUNCIONES MES DE JUNIO 2026

Andacollo, 30 de junio de 2026.

1.- Identificación del Servidor o Servidora Municipal a Honorarios.

Nombre	Diego Pastén Zárate
R.U.T.	

2.- Dependencia y función encomendada.

Dirección / Departamento / Oficina	SECPLAN
Función según contrato	Asesor Técnico- Ingeniero Constructor

3.- Funciones realizadas durante el mes de junio de 2026.

En el mes de junio de 2026, quien suscribe, realizó las siguientes funciones:

“Elaboración de Especificaciones Técnicas y Presupuestos, para proyectos de mejoramiento de espacios públicos y edificios de administración municipal”.

✓ **TERMINADO.**

Ⓢ **PENDIENTE (EN PROCESO).**

- Proyecto “Construcción de platabanda Obispo Fontecilla”

✓ Se realiza las especificaciones técnicas de proyecto “Construcción de platabanda Obispo Fontecilla” en el cual se detalla el proceso de construcción, materialidad y método constructivo de las siguientes partidas:

OBRAS PRELIMINARES

- Letreros de obra
- Cierre Provisorio

CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

- Oficinas
- Baño químico
- Bodega

NIVELACIÓN DE TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRA PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE

- Escarpe
- Relleno Estabilizado E = 15cm (Compactado)

OBRA GRUESA REPLANTEO

- Replanteo, Trazado de Ejes y Niveles

EXCAVACIONES

- Excavación Fundaciones de Muros y muretes
- Excavación de Solerillas
- Aprovechamiento de material de excavaciones
- Extracción de escombros y transporte a botadero

BASE GRANULAR (60-80)% CBR

- Cama de Ripio E = 5cm

HORMIGÓN

- Hormigón de emplantillado
- Hormigón de cimientos G-20
- Hormigón de sobrecimientos
- Albañilería de bloque (Con estuco)
- Hormigón de columnas
- Hormigón de cadenas
- Hormigón base solerillas
- Hormigón radier estampado
- Hormigón de muro continuo G - 20

ENFIERRADURA E INSERTOS

- Enfierradura sobrecimientos
- Enfierradura Columnas
- Enfierradura Cadenas
- Enfierradura Radier
- Enfierradura de muro continuo
- Sistema de drenaje

MOLDAJE

- Moldaje de sobrecimientos y cadenas (2 usos)
- Moldaje de columnas
- Moldaje Muro continuo

SOLERILLAS

- Suministro e instalación de solerillas

IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJE

- capa de ripio de muros
- Impermeabilización de muro continuo
- Impermeabilización de Radier

TERMINACIONES**ACERAS**

- Mortero de pega podotáctil
- Baldosa podotáctil alerta 40x40
- Baldosa podotáctil direccionales 40x40

CUBRESUELOS

- Piedrecilla

REVESTIMIENTO DE MUROS

- Mejoramiento de base bandera
- Revestimiento piedra laja

ELEMENTOS URBANOS DE EQUIPAMIENTO

- Mobiliario
- Banca madera – metal
- Basurero (BAS)

PAISAJISMO

- Mioporo
- Lavanda
- Plumeros
- Doquilla

PROYECTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN**EMPALME ELÉCTRICO**

- Equipos de medida
- Poste Empalme eléctrico

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

- Cable RZ1-K 4MM2
- Camarilla de registro
- Cama de arena
- Excavaciones
- Barra Copperweld con conector de bronce
- Mediciones geo eléctricas y memorias de cálculo sistema puesta a tierra

TABLEROS ELÉCTRICOS

TDA (Disyuntor general bipolar, Automático 10A, Protector diferencial 25A

DISTRIBUCIÓN

- Conductor Ø4MM RZ1-K

CANALIZACIONES

- Excavaciones
- Cama de arena
- Mortero coloreado y cinta de peligro
- Relleno natural

CÁMARAS DE DERIVACIÓN

- Derivación interior de poste

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

- Luminaria
- Poste tubular 3mts.

TRAMITES DE RECEPCIÓN ELÉCTRICA Y OTROS

- Gestiones y trámites Cía. Eléctrica
- Planos AS BUILT.
- Recepción Eléctrica (TE-2).
- Aseo general y entrega de obra

Registro fotográfico de ubicación de proyecto:



- Proyecto “Construcción de Centro deportivo La Católica”

- ✓ Se realiza proyecto “Construcción de centro deportivo La Católica”, donde se realizan las siguientes partidas (Incluye cubicaciones, cotizaciones, análisis de precios unitarios, EE.TT y presupuesto):

MOVIMIENTOS MASIVOS DE TIERRA

- Obras de demolición de instalaciones existentes
- Obras de demolición cierre perimetral
- Limpieza, Escarpe y Emparejamiento del Terreno
- Replanteo, Trazado y Niveles

OBRAS PROVISORIAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**INSTALACIONES DE FAENA**

- Construcciones provisorias
- Oficina 3x2
- Bodega Materiales y equipos 3x2
- Baño Químico
- Cierres Provisorios
- Instalaciones provisorias (Empalmes)
- Empalme Provisorio a Red Eléctrica
- Conexión provisorio a red de agua potable y alcantarillado

- Letrero de Obra

OFICINA Y CAMARINES

OBRA GRUESA

- Fundaciones

Excavaciones

Barrera de Humedad (Membrana de Polietileno)

Emplantillado

- Cimientos
- Viga de Fundaciones
- Radier
- Tabiquería
- Estructura Techumbre y Cubierta
- Estructura Techumbre
- Celosías
- Cubierta incluye (placa OSB 9,5mm, fieltro asfáltico y Zinc)
- Hojalatería y Bajada de Aguas Lluvias

TERMINACIONES

- Cielos
- Aislante Lana Mineral o placas de Aislapol
- Pasta Enlucidos cielo
- Revestimientos y Pavimentos Interiores
- Revestimiento paredes Camarines
- Cerámicos Muros 20x30 cms
- Cerámica Piso 45x45 cms
- Pinturas
- Molduras

SOMBREADERO

- Fundaciones
- Pilares Acero (Incluye Anclaje) 150x150x3mm
- Vigas de Acero
- Tabiquería
- Techumbre
- Hojalatería y Aguas Lluvias
- Bajada de Aguas Lluvias
- Cielos
- Revestimiento
- Pinturas
- Esmalte al Agua
- Esmalte Sintético
- Molduras

INSTALACIONES Y ARTEFACTOS SANITARIOS

- Artefactos sanitarios
- Grifería y accesorios
- Agua Potable
- Red de agua potable fría (Incluye terminales, curvas, reducciones y coplas)
- Red de agua caliente (Incluye terminales, curvas, reducciones y coplas)
- Termos Eléctrico
- Alcantarillado
- Unión domiciliaria
- Movimiento de Tierras
- Suministro Colocación y Pruebas de Tuberías (Incluye curvas, reducciones, coplas y terminales)
- Cámaras de Inspección
- Cámara desgrasadora
- Rotura y Reposición de Pavimentos

PROYECTO ELÉCTRICO

- Empalme Eléctrico
- Tablero General
- Alumbrado y luminarias

- Luminarias Exteriores
- Postes
- Luminarias

OBRAS COMPLEMENTARIAS

- Cierre perimetral
- Muro Fachada
- Albañilería de Bloque (Incluye tensores)
- Revestimiento Piedra Laja
- Cierre perimetral Cancha
- Muro de contención
- Circulaciones Exteriores
- Cubre suelos Tiki - Tiki
- Radier
- Cancha rayuela
- Pavimento caucho
- Circuito calistenia
- Puerta Acceso cancha
- Puerta y Portón metálicos


CANCHA DE FUTBOLITO

- Excavaciones
- Sistema de drenaje
- Geotextil
- Base estabilizada o cama de ripio (compactada)
- Pasto Sintético
- Arena sílice
- Caucho

ENTREGA DE OBRAS

- Instalación Placa Recordatoria
- Limpieza de terreno
- Aseo General y Entrega

Imagen de referencia del proyecto:

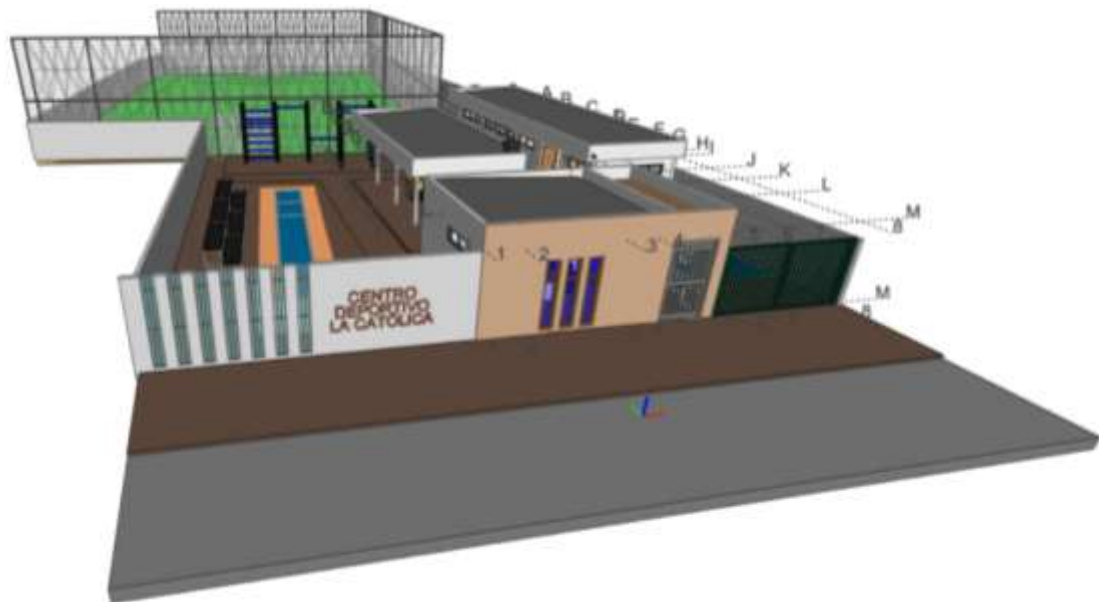

4.- Funciones instruidas mediante delegaciones de funciones o solicitudes de apoyo a otras unidades.

--

5.- Ausencias justificadas (debe indicar las fechas en que efectuó uso de permisos administrativos, feriados legales, descanso complementario, licencias médicas o permisos especiales).

--

Se extiende el presente informe para acreditar ante la Municipalidad de Andacollo, el pago de los honorarios pactados según el contrato vigente en el mes junio de 2026.

Para constancia firman:

Diego Pastén Zárate
Servidor Municipal a Honorarios

Rodrigo Urrutia Collao
Secretario Comunal de Planificación
